



EUROPSKA UNIJA

„ULAGANJE U BUDUĆNOST“



KONKURENTNA
HRVATSKA



MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA – 1. faza NA POLA PUTA...



EUROPSKA UNIJA



„ULAGANJE U BUDUĆNOST“



KONKURENTNA
HRVATSKA



PROJEKT

Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba I. faza

NA POLA PUTA...

Nositelj projekta
Grad Zagreb

Partner projekta
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba



EUROPSKA UNIJA



KONKURENTNA
HRVATSKA



„ULAGANJE U BUDUĆNOST“

FINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta

37.853.343,04 HRK

Bespovratna sredstva (sredstva Europske unije)

35.960.675,88 HRK (95 % sufinanciranja)

Sredstva od korisnika i partnera

1.892.667,16 HRK

**Projekt sufinancira Europska unija iz Europskoga
fonda za regionalni razvoj (EFRD)**



EUROPSKA UNIJA



„ULAGANJE U BUDUĆNOST“



KONKURENTNA
HRVATSKA



PROVEDBE JAVNIH I BAGATELNIH NABAVA

- Od ukupno planiranih 12 javnih nabava u sklopu projekta modernizacije 8 je dovršeno i ugovoreno, 1 je u tijeku, 1 je u pripremi, a 2 su planirane u kasnijoj fazi projekta.
- Obavljene 2 ex ante kontrole (prije objave) otvorenih postupaka javne nabave od strane SAFU-a
- Od 5 planiranih bagatelnih nabava, 3 su dovršene i ugovorene te su realizacije u tijeku. 1 bagatelna nabava je u objavi, a 1 se planira krajem projekta.
- Do sada je ugovoreno/realizirano 81,63% planiranih nabava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, radova 90,99%, usluga 89,46%, dok nabava opreme još nije započela (planirana je u kasnijim fazama projekta).



EUROPSKA UNIJA

KONKURENTNA
HRVATSKA

„ULAGANJE U BUDUĆNOST“

PROVEDENE NABAVE I NJIHOVA VRIJEDNOST

Vrsta nabave	Procijenjeni iznos nabave (HRK)	Vrijednost ugovora /Realizacija (HRK)	Ostaje za realizaciju	Postotak realizacije (ugovoreno)
RADOVI	30.808.814,00	28.032.166,10	-2.776.647,90	90,99%
Otvoreni postupci	29.874.990,00	27.380.994,60		
Bagatelne nabave	933.824,00	651.171,50		
USLUGE	2.603.323,00	2.328.883,50	-274.439,50	89,46%
Otvoreni postupci	2.496.723,00	2.302.883,50		
Bagatelne nabave	106.600,00	26.000,00		
OPREMA	3.017.550,00	0,00	-3.017.550,00	0,00%
Otvoreni postupci	3.017.550,00	0,00		
Bagatelne nabave	0,00	0,00		
PROJEKTNI TIM	1.423.656,04	537.915,14	-885.740,90	37,78%
UKUPNO PROJEKT	37.853.343,04	30.898.964,74	-6.954.378,30	81,63%

KARTA ZOO VRTA S UCRTANIM POTPROJEKTIMA




KONKURENTNA
HRVATSKA



zoo
Zagreb

- Potprojekti u tijeku
- Ugovoreni potprojekti
- Neugovoreni potprojekti

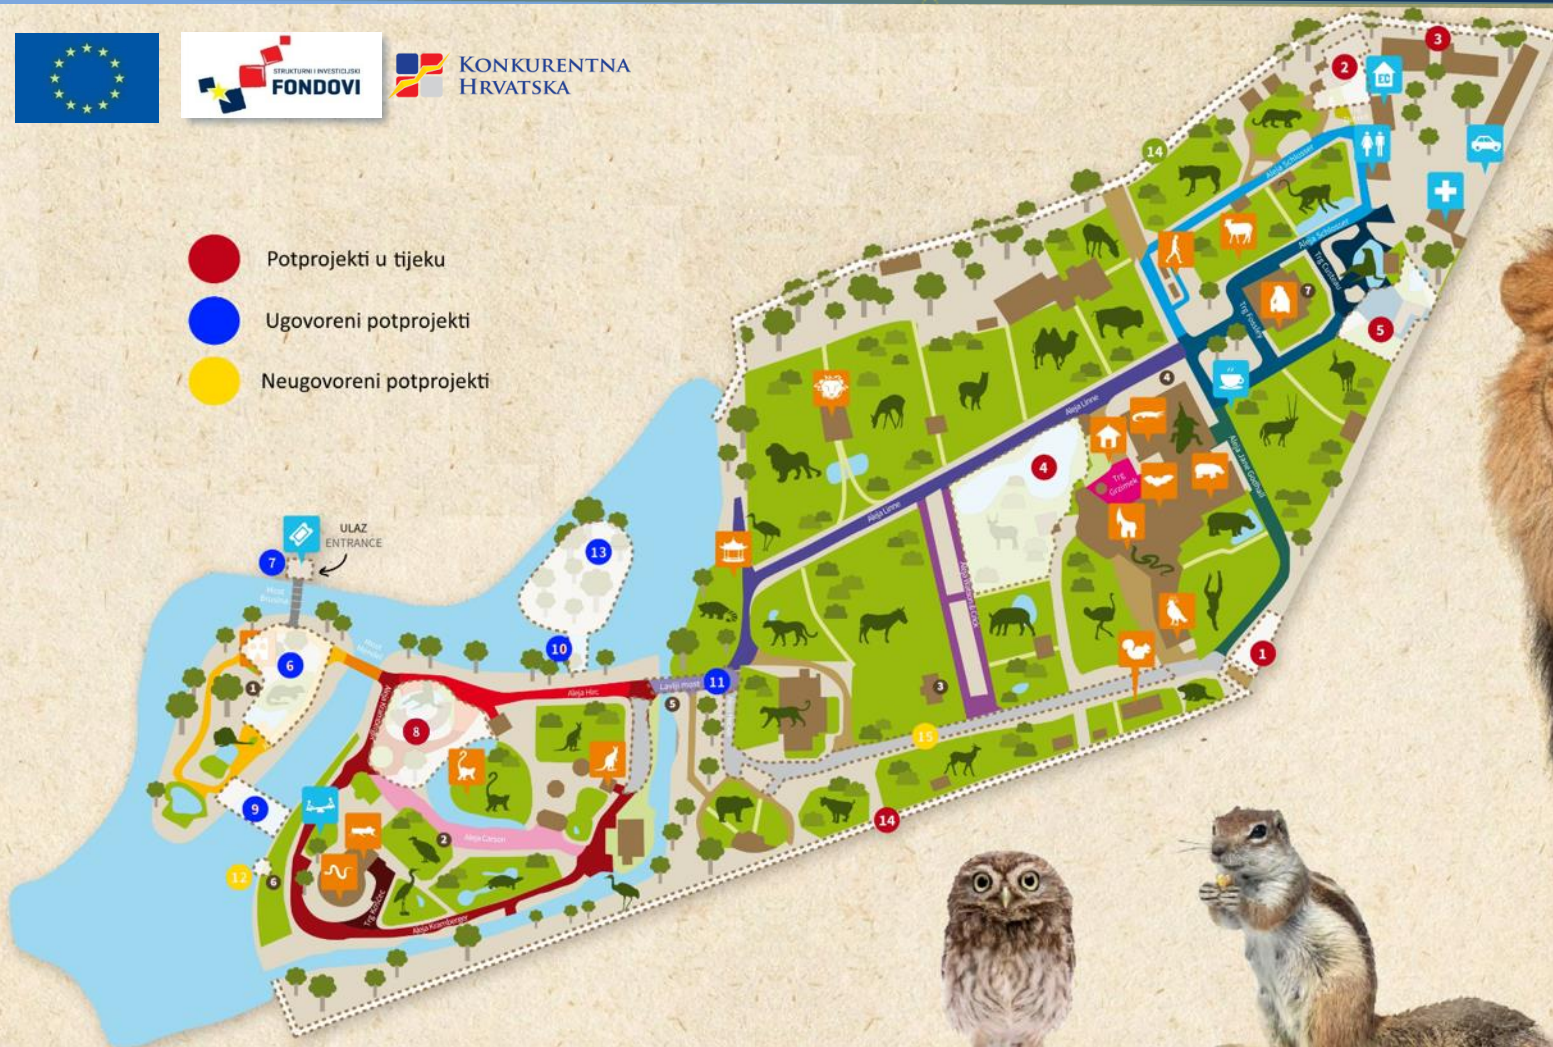

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 1 Istočni ulaz
/East entrance | 4 Volijera za afričke ptice
/Free-flight aviary for African birds | 7 Infokućica
/Info centre | 10 Darwinov most
/Darwin's Bridge | 13 Labuđi otok
/The Swan Island |
| 2 Edukacijski centar
/The Education Centre | 5 Restoran, odmorište, vidikovac
The restaurant, rest area and viewpoint | 8 Madagaskar
/Madagascar | 11 Lavlji most
/The Lion's Bridge | 14 Ograda Zoo vrta
The Zoo Fences |
| 3 Centralna kotlovnica
/Central heating unit | 6 Glavni ulaz s nastambom za pelikane
/The main entrance with a pelican enclosure | 9 Ribarev most
/The Fisherman's Bridge | 12 Napuljski ribar
/The Neapolitan Fisherman | 15 Staze i šetnice
/Trails and paths |

1. Istočni ulaz u Zoološki vrt



Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku - 33% dovršenosti

Predviđeno vrijeme za izvođenje radova: 3 mjeseca

Procijenjena vrijednost potprojekta: 922.944,94 kn



2. Proširenje edukacijskog centra



Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku - 40% dovršenosti

Predviđeno vrijeme realizacije: proljeće 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 3.231.325,26 kn



3. Sanacija centralne kotlovnice



Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku - 99% dovršenosti

Predviđeno vrijeme za izvođenje radova: 3 mjeseca


Predviđeni ukupni troškovi: 1.077.206,00 kn



4. Volijera za afričke ptice



Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku - 40% dovršenosti
Predviđeno vrijeme za izvođenje radova: proljeće 2016
Predviđeni ukupni troškovi: 4.221.712,77 kn

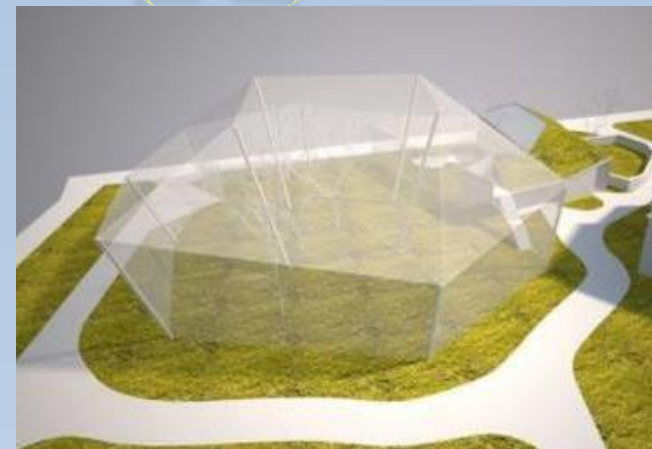

5. ROV Centar – restoran, odmorište, vidikovac




Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku - 40% dovršenosti

Predviđeno vrijeme realizacije: proljeće 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 6.885.687,74 kn

14. Ograda Zoološkog vrta

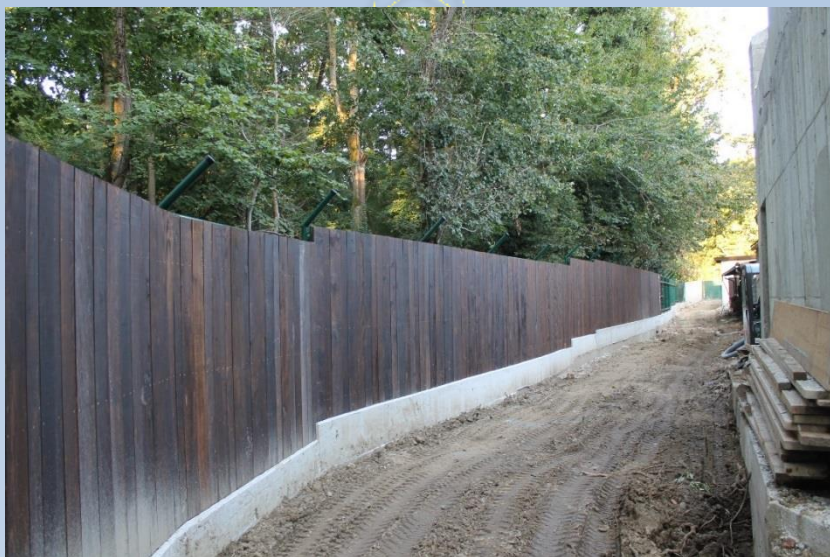

Spremnost potprojekta: Radovi u tijeku na sjevernoj strani ZOO-a - 45% dovršenosti, Radovi započeli na južnoj strani

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Predviđeni ukupni troškovi: 1.276.100,00 kn



UGOVORENI POTPROJEKTI – POČETAK REALIZACIJE JESEN 2015.

MADAGASKAR

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor, prijavljen početak gradnje

Predviđeno vrijeme realizacije: Ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 6.084.799,17 kn

GLAVNI ULAZ

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor, prijavljen početak gradnje

Predviđeno vrijeme realizacije: Ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 4.147.496,35 kn

INFO KUĆICA

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor, prijavljeno GZZSKiP-u

Predviđeno vrijeme realizacije: Proljeće 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 621,962,25 kn



UGOVORENI POTPROJEKTI – POČETAK REALIZACIJE JESEN 2015.

PJEŠAČKI MOST 1 (Ribarev most)

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor, prijavljen početak gradnje

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 973.200,50 kn



PJEŠAČKI MOST 2 (Darwinov most)

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor, prijavljen početak gradnje

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 612.592,97 kn



LAVLJI MOST

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor – Izdano Rješenje od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 1.337.865,92 kn

UGOVORENI PODPROJEKTI – POČETAK REALIZACIJE PROLJEĆE 2016.

LABUĐI OTOK

Spremnost potprojekta: Sklopljen ugovor – Izdano
Rješenje od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika
kulture i prirode

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta :

1.029.888,35 kn



NEUGOVORENI PODPROJEKTI

STATUA NAPULJSKOG RIBARA

Spremnost potprojekta: U tijeku postupak nabave

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 270.000,00 kn

SANACIJA STAZA I ŠETNICA S INFRASTRUKTUROM

Spremnost potprojekta: U pripremi

Predviđeno vrijeme realizacije: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 2.127.679,00



OSTALI POTPROJEKTI

PRIVREMENE VOLIJERE I NASTAMBE

Spremnost potprojekta: Završeno

Predviđeno vrijeme realizacije: realizirano

Procijenjena vrijednost potprojekta : 480.000,00 kn

PRIVREMENI CIJEVNI PRIJELAZ (CPM)

Spremnost potprojekta: U funkciji

Predviđeno vrijeme uklanjanja: ljeto 2016

Procijenjena vrijednost potprojekta : 183.824,00

IZRADA ELABORATA VITALNOSTI I STATIKE BUKVE

Spremnost potprojekta: U tijeku

Predviđeno vrijeme realizacije: jesen 2015

Procijenjena vrijednost potprojekta : 26.600,00





EUROPSKA UNIJA



„ULAGANJE U BUDUĆNOST“



KONKURENTNA
HRVATSKA




MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA U ZAGREBU 1.FAZA NA POLA PUTA...

- Projekt se dosada odvijao po planu i bez većih problema
- Projektni tim je pravovremeno reagirao na sve potencijalne rizike u provedbi projekta
- U otežanim okolnostima Zoološki vrt nastavlja obavljanje svoje djelatnosti

USKORO U ZOO VRTU U SKLOPU PROJEKTA MODERNIZACIJE

Prvi stanovnici velike letne volijere
/The first inhabitants of the large
free-flight aviary



Čaplja govedarica /Cattle egret



Afrička bijela žličarka /African spoonbill



Bjelolica utva zviždara /White-faced whistling duck



Batoglava čaplja /Hamercop



Blistavi ibis /Glossy ibis



Plavolica roda /Abdim's stork



Krunati ždral /Grey crowned crane





EUROPSKA UNIJA



KONKURENTNA
HRVATSKA



„ULAGANJE U BUDUĆNOST“

USKORO U ZOO VRTU U SKLOPU PROJEKTA MODERNIZACIJE



Dalmatinski pelikan (lat. *Pelecanus crispus*)



Prstenastorepi lemuri
(*Lemur catta*) uskoro u
novoj nastambi



EUROPSKA UNIJA

„ULAGANJE U BUDUĆNOST”



KONKURENTNA
HRVATSKA



ZOO
Zagreb

Hvala na pažnji!



Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornost Grada Zagreba i Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.
